

Исх. № 1211-01/13 от 12 ноября 2013 г

## Коммерческое предложение

### Спецификация

Модульное здание (Проходная) – **269 000 (Двести шестьдесят девять тысяч) рублей, в т.ч. НДС\***

Срок производства – 10-12 рабочих дней.

### Комплектация:

Блок-контейнер - 2 шт.;

Габаритные размеры Проходной 4,00х3,40х2,80м;

Каркас – сварной, металлический, усиленный, нижняя и верхняя обвязка – швеллер гнутый **140мм**, угловые стойки – угол **120мм**, загрунтован и окрашен, цвет зеленый мох RAL6005;

Деревянный каркас – стеновой каркас – доска 40х100; половые лаги – доска 40х100, потолочные лаги – доска 40х100;

Утепление - 100мм (ISOVER) по объему (пол, стены, потолок) – 1 шт. (комплект);

Ветрозащита, пароизоляция – пленка техническая 45 мкр.;

Внешняя отделка - оцинкованный профлист С8, полимерное покрытие цвет бежевый RAL 1004;

Кровля - двухскатная, сварная, из листа 1,3 мм, высота 100мм, цвет зеленый мох RAL6005;

Дно – доска обрезная 20-22мм, зашито оцинкованным листом;

Перегородка – каркасные, утепленные;

Дверь входная - 2100х900мм, стальная, утепленная, с личиной и доводчиком, цвет бежевый RAL1004 - 2шт.;

Дверь межкомнатная – 2100х800, МДФ, ламинированная, белая, с замком и ручкой – 1шт.;

Окно(а)- 1200х1400 ПВХ, двухстворчатое, глухое, двухкамерный стеклопакет – 2шт.;

1200х1400 ПВХ, двухстворчатое, одна створка п/о, двухкамерный стеклопакет, москитная сетка – 1шт.;

1200х2500, ПВХ, трехстворчатое, центральная створка п/о, 2 створки – глухие, двухкамерный стеклопакет, москитная сетка – 1шт.;

1200х1800, ПВХ, по центру форточка для передачи документов 600х600, однокамерный стеклопакет – 1шт.;

Пол – доска обрезная 22мм; доп. настил пола – ДСП 16мм.;

Отделка пола – линолеум коммерческий, стыки закрыты алюминиевыми порошками;

Плинтус – пластиковый;

Внутренняя отделка стен – панели ПВХ, темные оттенки

Внутренняя отделка потолка – панели ПВХ, цвет белый;

Электрооборудование Модульного здания – в кабель-каналах, ВВГ нг 3\*2,5/3\*1,5;

Светильник ЛПО 2\*40 – 3шт.; светильник уличный НПП с решеткой – 2шт.; выключатели одноклавишные – 3шт.; розетки двойные с заземлением – 1шт.; розетки одинарные с заземлением – 2шт.; щиток

Пластиковый – 1шт.; автоматы; УЗО; Евроввод

Сантехника – отсутствует;

Вентиляция – естественная;

Отопление - электроконвекторы с регулировкой мощности 1,5 кВт – 2шт.;

Мебель – отсутствует;

Доп.оборудование – отсутствует.

Транспортные расходы – в стоимость не включены.


Монтаж – включен в стоимость. Площадку для разгрузки предоставляет Покупатель, при подготовке площадки Покупатель обязан согласовать с Поставщиком схемы фундаментов, расположение и доступность для подъезда.

В состав работ не входит - устройство фундамента, осуществление подвода в сеть канализации и водопровода, установка системы пожаротушения и пожарной сигнализации.

Условия оплаты - осуществляется 100% предоплата за Модульное здание.  
Возможны другие варианты по согласованию с Поставщиком.

\*Обращаем Ваше внимание, цена может измениться.

### Схема Модульного здания.

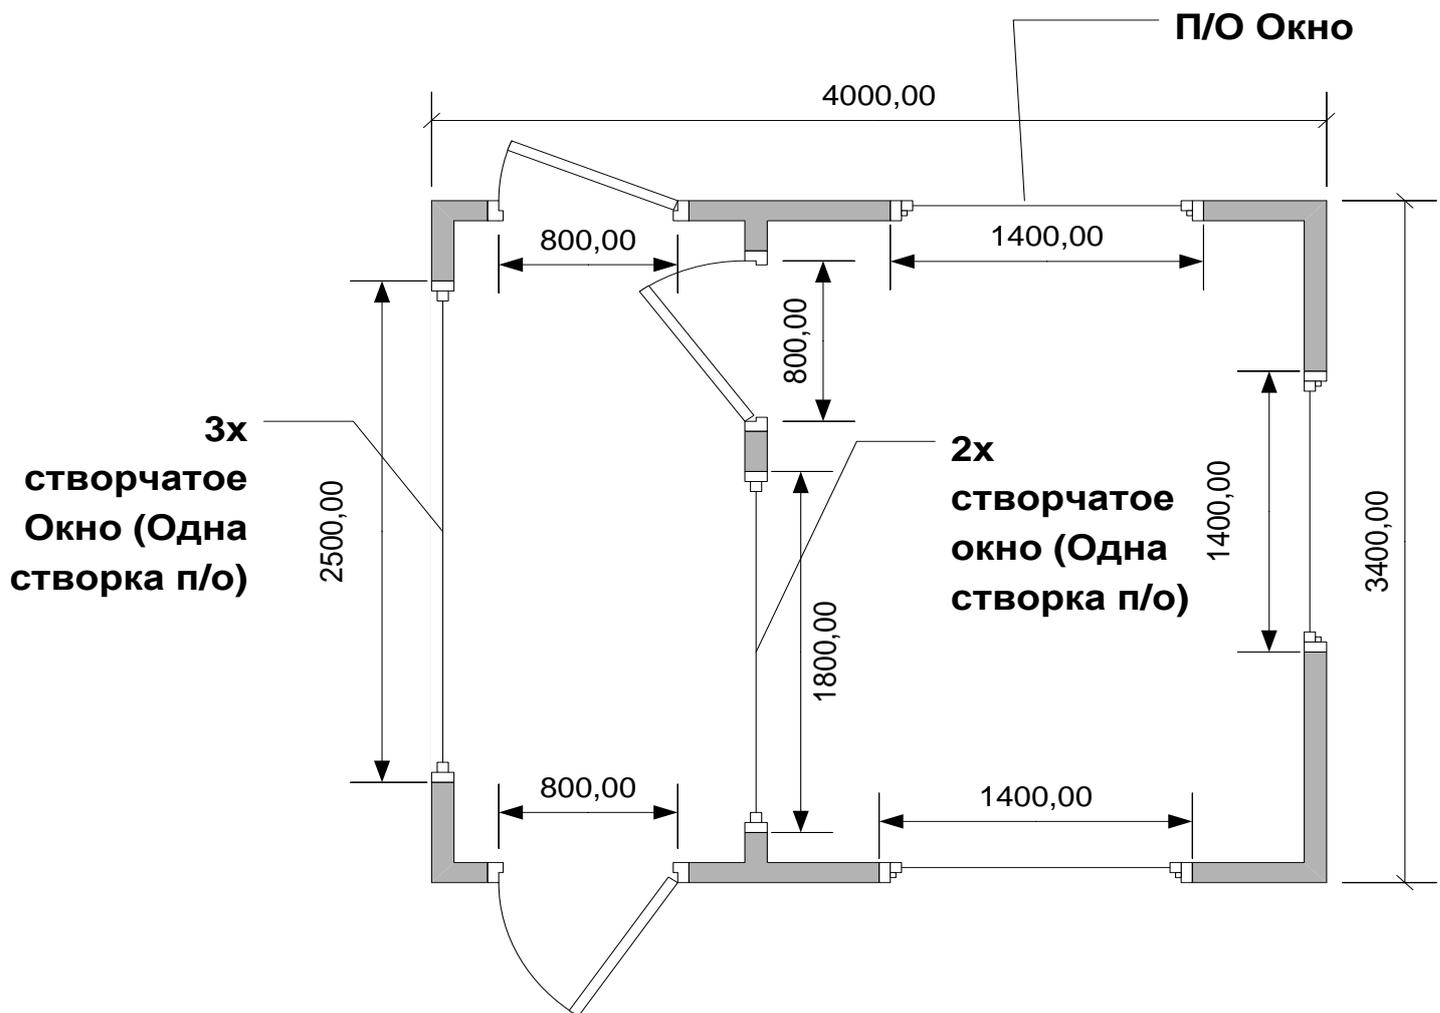

## Фотографии реализованных проектов

### Посты Охраны



## Пост охраны с пьедесталом и лестницей



## Синее полимерное покрытие



## Пост охраны с пьедесталом и лестницей, серый полимер





### Внутренняя отделка плиты МДФ, пластиковые окна



### Плиты МДФ, линолеум



**Проходная (белое полимерное покрытие, пластиковые  
окна,  
решетки на окнах)**



**Проходная (внутренняя отделка - вагонка ПВХ,  
пластиковое окно с форточкой для документов, линолеум,  
плинтус пластиковый, дверь белая МДФ)**



## Проходная с турникетом



## Модульное здание 10,00х6,00х5,00м (2 этажа, двухскатная кровля)



**Модульное здание 6,00x4,80м (полимерный профнастил,  
кровля плоская сварная,  
ПВХ стеклопакеты однокамерные, п/о 1100x900мм)**



**Блок-контейнер 6,00x2,40м (оцинкованный профнастил)**



**Блок-контейнер 6,00х2,50м (полимерный профнастил,  
металлическая дверь)**



### Металлическая решетка 1200х900мм



### Межкомнатная дверь ДГ 2100х800мм, панели ПВХ, линолеум



**ПВХ вагонка цветная (цвет серый), электропроводка  
в кабельканале**



**Деревянная вагонка, ПВХ стеклопакет, п/о 1100x900мм,  
межкомнатная дверь ДГ 2100x900мм, электропроводка в кабельканале,  
линолеум**





**«Проходная», панели МДФ (цвет бук)**



**Подготовка для внутренней отделки помещения (пергамин, изоспан, влаго-пароизоляция)**



**ПВХ панели цветные, конвектор электрический 1,5 кВт, линолеум,  
ПВХ стеклопакет**



**ПВХ вагонка, линолеум, деревянное окно ОДР 1200x900мм**





*С уважением, Устров Андрей  
Отдел продаж компании BusinessМодуль*

*Оптимальное решение модульного помещения.*

### **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**

- Тел.: + 7 (812) 269-30-38
- Моб. тел.: + 7 (981) 841-98-81
- E-mail: [bmodule812@gmail.com](mailto:bmodule812@gmail.com)
